


DIGITALE OBEYA

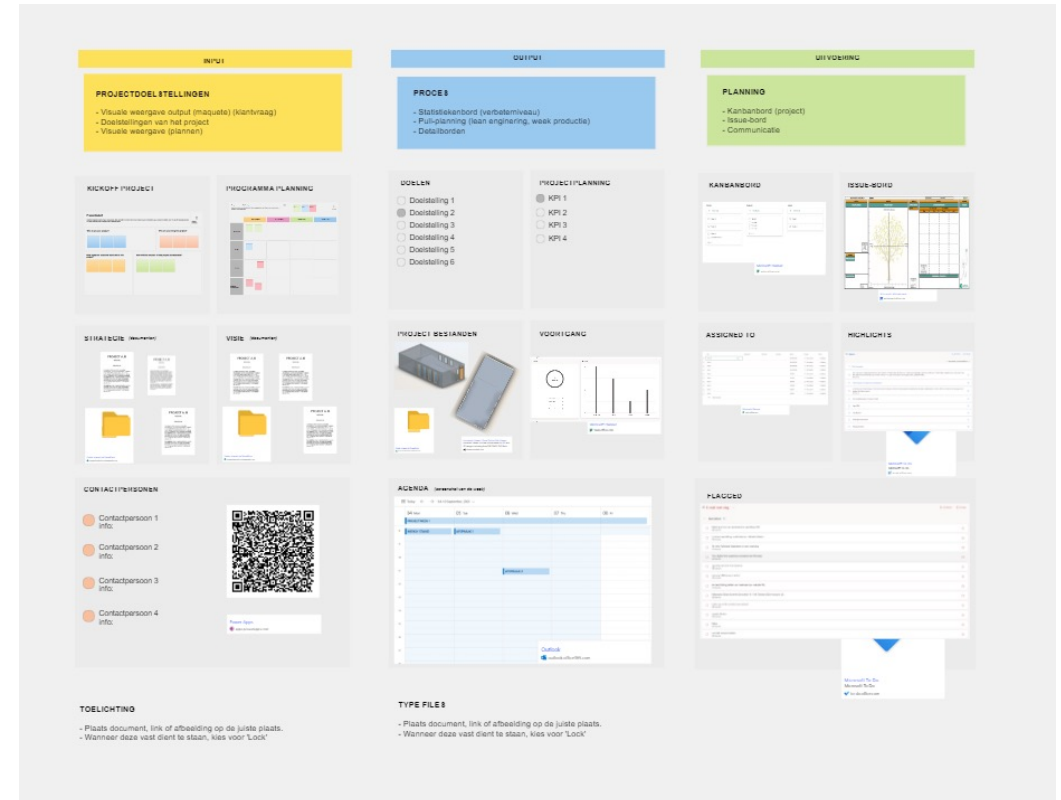

Een Obeya is een virtuele of fysieke locatie waar de bedrijfsstrategie in beeld wordt gebracht.

Binnen de Obeya wordt doelgericht overlegd en gewerkt.

In deze ruimte is alle informatie aanwezig die nodig is om effectief én efficiënt, binnen een gemengd team, gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.



Elke betrokken partij draagt daarom ook bij aan de juiste input van data/informatie in de Obeya.

Dit gebeurt op een consistente manier en met de nodige discipline, zodat de informatie steeds correct, betrouwbaar en vooral ook up-to-date is.






Dennis Franco – Democo - Sint-Truiden



Dennis Franco – Democo - Sint-Truiden

Een geschikte **digitale Obeya-omgeving** dient te voldoen aan een aantal voorwaarden:

- de informatie moet up-to-date zijn;
- gelinkt aan ieders agenda;
- gekoppeld aan het planbord;
- en makkelijk aanpasbaar zijn.

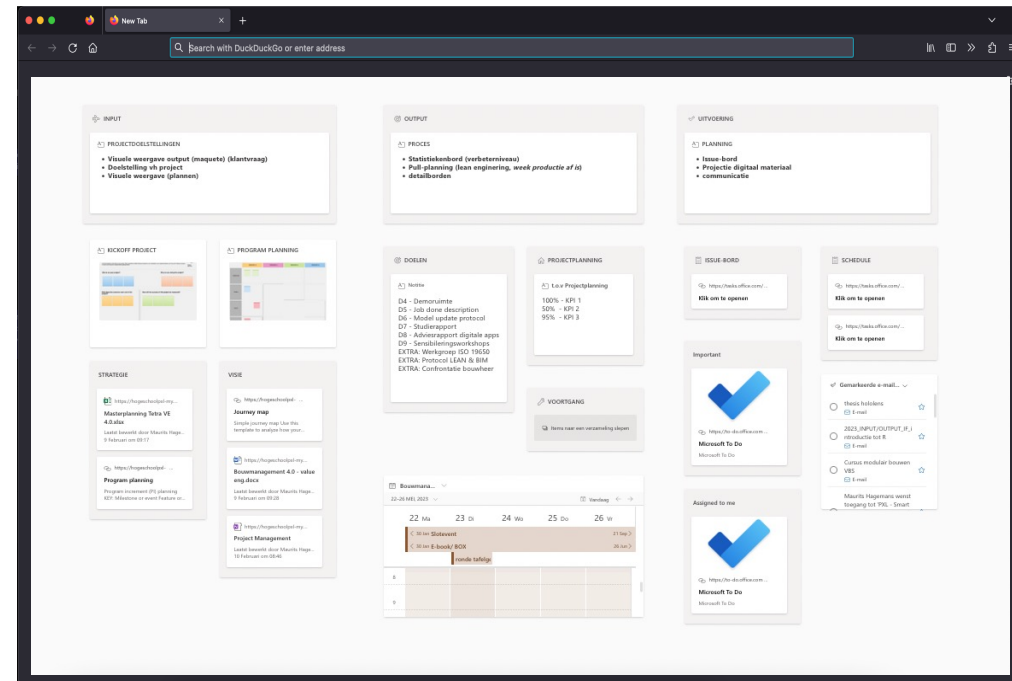

INPUT

PROJECTDOELSTELLINGEN

- Visuele weergave output (maquete) (klantvraag)
- Doelstelling vh project
- Visuele weergave (plannen)

KICKOFF PROJECT



PROGRAM PLANNING



STRATEGIE

<https://hogeschoolpal-ny...>

Masterplanning Tetra VE 4.0.xlsx

Laatst bewerkt door Maurits Hage...
9 Februari om 09:17

<https://hogeschoolpal-ny...>

Program planning

Program increment (PI) planning
KEY: Milestone or event Feature or...

VISIE

<https://hogeschoolpal-ny...>

Journey map

Simple journey map Use this
template to analyze how your...

<https://hogeschoolpal-ny...>

Bouwmanagement 4.0 - value eng.docx

Laatst bewerkt door Maurits Hage...
9 Februari om 09:28

<https://hogeschoolpal-ny...>

Project Management

Laatst bewerkt door Maurits Hage...
10 Februari om 08:46

OUTPUT

PROCES

- Statistiekenbord (verbeterniveau)
- Pull-planning (lean engineering, week productie af is)
- detailborden

DOELEN

Notitie

D4 - Demoruimte
D5 - Job done description
D6 - Model update protocol
D7 - Studierapport
D8 - Adviesrapport digitale apps
D9 - Sensibiliseringsworkshops
EXTRA: Werkgroep ISO 19650
EXTRA: Protocol LEAN & BIM
EXTRA: Confrontatie bouwheer


PROJECTPLANNING

L.o.v Projectplanning

100% - KPI 1
50% - KPI 2
95% - KPI 3

VOORTGANG

Items naar een verzameling slepen

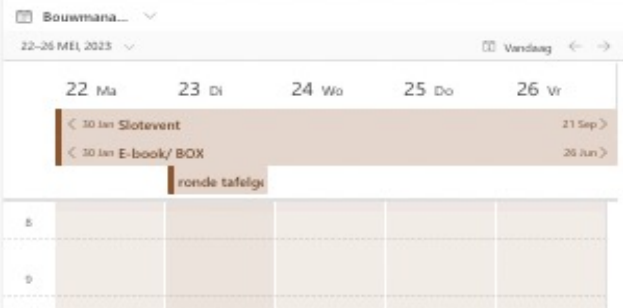

UITVOERING

PLANNING

- Issue-bord
- Projectie digitaal materiaal
- communicatie

ISSUE-BORD

[https://tasks.office.com/...](https://tasks.office.com/)

Klik om te openen

SCHEDULE

[https://tasks.office.com/...](https://tasks.office.com/)

Klik om te openen

[https://tasks.office.com/...](https://tasks.office.com/)

Klik om te openen

Important



[https://to-do.office.com/...](https://to-do.office.com/)

Microsoft To Do

Microsoft To Do

Assigned to me



[https://to-do.office.com/...](https://to-do.office.com/)

Microsoft To Do

Microsoft To Do

Gemarkeerde e-mail...

thesis hololens
E-mail

2023_INPUT/OUTPUT_IF_i
introduce tot R
E-mail

Cursus modulair bouwen
VBS
E-mail

Maurits Hagemans wenst
toegang tot 'POL - Smart
